

Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna

*Delibera CIPESS N. 64/2021
(Gazzetta Ufficiale del 14/01/2022 - Serie generale n. 10)*

Seduta annuale del Comitato di Sorveglianza

4 maggio 2023

Ordine del giorno

1. Relazione sullo stato di attuazione annuale al 31-12-2022 (*per approvazione*)
2. Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa del Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna (*per approvazione*)
3. Introduzione di quote di cofinanziamento di sei interventi con risorse locali e dello Stato (*informativa*)
4. Varie ed eventuali

Delibera CIPESS n. 2/2021

Punto 4: Istituzione o aggiornamento di un Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il CdS è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- ✓ nella prima seduta di insediamento adotta il proprio regolamento interno su proposta dell'AR del PSC;
- ✓ approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel Piano;
- ✓ **approva le relazioni di attuazione e/o finali;**
- ✓ esamina le proposte di modifica del Piano;
- ✓ esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- ✓ esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- ✓ esamina i risultati delle valutazioni.

La composizione del CdS (punto 4 della Delibera CIPESS 2/2021) non cambia, cambia la denominazione dei Ministeri

Ministero dell'istruzione →

Ministero dell'istruzione e del merito

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili →

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero della transizione ecologica →

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31-12-2022




Indice

1. IDENTIFICAZIONE PIANO FSC 2014-2020	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4. PSC - QUADRO D'INSIEME (sezione ordinaria)	6
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	13
5.1 Procedure di attivazione	13
5.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento	13
5.3 Sezione ordinaria: sintesi avanzamento finanziario	14
6. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19
7. QUADRO DELLE ECONOMIE	20
8. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	20
9. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	21
10. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	21
11. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)	23
12. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	24
13. VALUTAZIONE	24
14. SORVEGLIANZA	24
15. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	26
16. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	27
17. ASSISTENZA TECNICA	28
18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	29
19. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	30

Area tematica	PSC sezione ordinaria	Settori d'intervento (preliminari)
4 ENERGIA	989.192,00 €	4.1 EFFICIENZA ENERGETICA
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.990.357,00 €	5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO
6 CULTURA	3.500.000,00 €	6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO
7 TRASPORTI E MOBILITA'	40.164.949,00 €	7.1 MOBILITÀ URBANA
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	29.600.101,00 €	8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	29.675.758,00 €	11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.079.643,00 €	12.1 ASSISTENZA TECNICA
Totale	107.000.000,00 €	

Tabella 2 - Aree tematiche e settori di intervento.
Ripartizione delle risorse per area tematica.

- 4 ENERGIA
- 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI
- 6 CULTURA
- 7 TRASPORTI E MOBILITA'
- 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA
- 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA

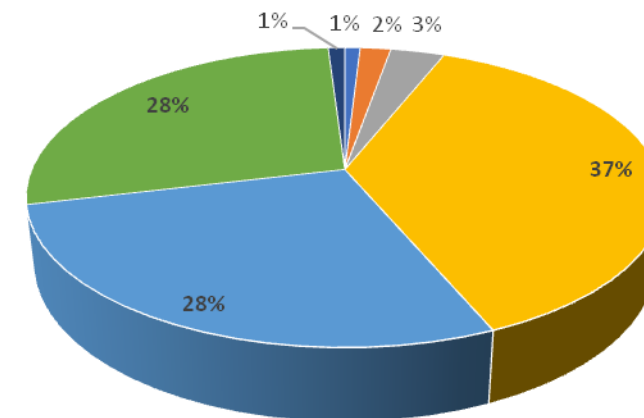

* Si precisa che non sussistono variazioni rispetto a quanto presentato nella Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2021

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria alla data del 31/12/2022

SETTORI DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	Parte PSC Chiusa	Parte PSC Attiva	Totale PSC
	04 - ENERGIA		
4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
totale	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
totale	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
	06 - CULTURA		
6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
totale	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'		
7.1 - MOBILITÀ URBANA	0,00 €	40.164.949,00 €	40.164.949,00 €
totale	0,00 €	40.164.949,00 €	40.164.949,00 €
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
totale	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
totale	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
12.1 - ASSISTENZA TECNICA	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
totale	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
TOTALE PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA			107.000.000,00 €

* Si precisa che non sussistono variazioni rispetto a quanto presentato nella Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2021

Avanzamento contabile per area tematica al 31/12/2022

Area tematica	N. interventi strategici	Costo totale (€)	Costo FSC (€)	Costo realizzato FSC (€)	Impegnato FSC (€)	Impegnato FSC/Costo FSC (%)
4. Energia	1	€ 989.192,00	€ 989.192,00	€ 969.341,25	€ 988.859,79	99,97%
5. Ambiente e risorse naturali	9	€ 2.035.293,04	€ 1.990.357,00	€ 1.866.517,53	€ 1.981.629,54	99,56%
6. Cultura	3	€ 4.830.000,00	€ 3.500.000,00	€ 791.485,11	€ 3.389.886,52	96,85%
7. Trasporti e mobilità	4	€ 44.403.401,97	€ 40.164.949,00	€ 7.496.331,89	€ 35.171.722,28	87,57%
8. Riqualificazione urbana	2	€ 34.600.101,00	€ 29.600.101,00	€ 1.318.485,50	€ 4.857.772,86	16,41%
11. Istruzione e formazione	10	€ 32.231.414,08	€ 29.675.758,00	€ 7.788.841,02	€ 24.904.419,46	83,92%
12. Capacità amministrativa	1	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00	€ 609.695,14	€ 1.061.224,64	98,28%
TOTALE	30	€ 120.169.045,09	€107.000.000	€20.840.697,44	€72.355.515,09	67,62%

2. Prospetto 4 – Aggiornamento del Piano finanziario relativamente alle previsioni triennali di spesa

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (2022)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2023)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2024)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (2025)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	20.840.697,44 €	43.754.884,14 €	27.104.331,52 €	15.300.086,90 €	107.000.000,00 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
totale	20.840.697,44 €	43.754.884,14 €	27.104.331,52 €	15.300.086,90 €	107.000.000,00 €

Avanzamento procedurale per area tematica al 31/12/2022

Area tematica	N. interventi strategici	Fase di progettazione	Fase di aggiudicazione lavori	Fase di esecuzione lavori	Lavori conclusi
4. Energia	1				1
5. Ambiente e risorse naturali	9		1	1	7
6. Cultura	3			1	2
7. Trasporti e mobilità	4*			3	
8. Riqualificazione urbana	2		1	1	
11. Istruzione e formazione	10		2	5	3
12. Capacità amministrativa	1*				
TOTALE	30*	-	4	11	13

**A marzo gli
interventi conclusi
sono pari a 14**

*Si riportano i dati di sintesi procedurale dei 28 interventi di opere pubbliche del programma, suddivisi per aree tematiche.

I restanti 2 interventi sono relativi a fornitura di beni e servizi. In particolare si evidenzia che:
la *Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore* risulta conclusa con l'approvazione del "progetto definitivo";
l'*Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione* è in corso di attuazione e proseguirà fino alla conclusione dell'attuazione dell'intero PSC.

Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento

In sintesi, la tabella (pag. 5-7 della Relazione) illustra le seguenti voci di informazioni per tipologia di intervento:

- ✓ **area tematica**, a cui l'intervento appartiene;
- ✓ **nome** dell'intervento strategico;
- ✓ **codice progetto**, inserito in BDU;
- ✓ **Soggetto attuatore** (CM, Comuni, Unioni dei Comuni);
- ✓ **costo totale** dell'intervento;
- ✓ **costo a carico del FSC 2014-2020**;
- ✓ quote di **cofinanziamento**;
- ✓ **economie disponibili** per la riprogrammazione;
- ✓ **costo realizzato con risorse FSC**, al 31.12.22;
- ✓ **risorse FSC impegnate dal SA**, al 31.12.22;
- ✓ **pagamenti FSC effettuati** al 31.12.22;
- ✓ **avanzamento procedurale** (in attuazione, indizione gara per affidamento lavori, lavori aggiudicati, esecuzione lavori, lavori conclusi).



Presidenza
del Consiglio dei Ministri


FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

AREA TEMATICA	Intervento strategico	Codice	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Cofinanziamento	Economie registrate da riprogrammare	Costo realizzato FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Avanzamento procedurale
04 - ENERGIA	Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Comadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	BOSM01	Città metropolitana di Bologna	€ 989.192,00	€ 989.192,00			€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	Lavori conclusi
				€ 989.192,00	€ 989.192,00			€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Opere di consolidamento dei versanti nella località Capoluogo - Comune di Camugnano	BOAB03	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 140.000,00	€ 140.000,00		€ 8.297,76	€ 131.702,24	€ 131.702,24	€ 131.702,24	Lavori conclusi
	Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano	BOAB01	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 149.440,12	€ 149.440,12			€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	Lavori conclusi
	OBIR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)	BOAB02	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 110.916,88	€ 110.916,88			€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	Lavori conclusi
	Opere di consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savana, Rio Ordini	BOAB04	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 340.000,00	€ 340.000,00			€ 327.013,02	€ 339.570,30	€ 327.013,02	Esecuzione lavori
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Ca Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	BOSI01	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 205.374,79	€ 191.940,78	€ 13.434,01		€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) - 1° Stralcio	BOSI02	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 344.854,93	€ 313.352,90	€ 31.502,03		€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	BOSI03	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 244.706,32	€ 244.706,32			€ 244.706,32	€ 244.706,32	€ 244.706,32	Lavori conclusi
	Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	BOVS01	Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 395.855,24	€ 395.855,24			€ 395.037,67	€ 395.855,24	€ 395.037,67	Lavori conclusi
	Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro	BOSV02	Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 104.144,76	€ 104.144,76			€ 2.407,60	€ 104.144,76	€ 2.407,60	Lavori aggiudicati e stipula contratto (Determina n. 677 del 07/12/2022)
				€ 2.035.293,04	€ 1.990.357,00	€ 44.936,04	€ 8.297,76	€ 1.866.517,53	€ 1.981.629,54	€ 1.866.517,53	
06 - CULTURA	Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	BOVE01	Comune di Vergato	€ 399.760,90	€ 399.760,90			€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	Lavori conclusi
	Recupero di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato - Lavori di sistemazione dell'area esterna	BOVE02	Comune di Vergato	€ 100.239,10	€ 100.239,10			€ 83.563,84	€ 100.125,62	€ 83.563,84	Lavori conclusi
	Riqualificazione dell'area Teatro Comunale	BOTC01	Comune di Bologna	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.330.000,00		€ 308.160,37	€ 2.890.000,00	€ 308.160,37	Esecuzione lavori
				€ 4.830.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.330.000,00		€ 791.485,11	€ 3.389.886,52	€ 791.485,11	
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	Nodo di Rastignano - 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svicolato di Rastignano - Ponte delle Oche	BORA01	Città metropolitana di Bologna	€ 30.664.949,00	€ 30.664.949,00			€ 1.897.745,85	€ 25.891.066,51	€ 1.897.745,85	Esecuzione lavori
	Progettazione linea a tram F.I.CO - Stazione Bologna Centrale - Ospedale Maggiore	BOTR01	Comune di Bologna	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00	€ 3.938.452,97		€ 3.986.454,05	€ 4.000.000,00	€ 3.986.454,05	Intervento concluso con progetto definitivo approvato (Delibera di Giunta Comune di Bologna PG344906)
	Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	BOIM01	Comune di Imola	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00			€ 751.456,85	€ 3.000.000,00	€ 751.456,85	Esecuzione lavori
	Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovía del Sole Marzabotto-Silla - stralcio funzionale Sperticano-Riola	BOEU01	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00	€ 300.000,00		€ 860.675,14	€ 2.280.655,77	€ 742.618,53	Esecuzione lavori
				€ 44.403.401,97	€ 40.164.949,00	€ 4.238.452,97		€ 7.496.331,89	€ 35.171.722,28	€ 7.378.275,28	



Modifiche nell'ambito dell'attuazione del Piano avvenute nel 2022:

1. Inserimento del nuovo intervento « *Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro* » € 104.144,76 (Soggetto Attuatore: Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia) a seguito di procedura di consultazione scritta per motivi urgenti e riprogrammazione di economie dell'« *Intervento di consolidamento pendici in località Calderino* »;
2. Interventi « *IS "Montessori-Da Vinci" Alto Reno Terme - miglioramento sismico* », « *Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna* », « *Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A* », « *Liceo Artistico ISART di Bologna* », « *IIS Scappi succursale ora IPSAR Luigi Veronelli di Casalecchio di Reno* », « *IIS Alberghetti succursale di Imola* », « *Liceo Laura Bassi di Bologna*, « *Convitto Scarabelli di Imola* »: : informative in merito all'utilizzo di economie da ribasso di gara

L'implementazione del PSC metropolitano: Informazione e Pubblicità


1. Ideazione del *naming* “Cresce Bologna” e relativo logo;
2. Organizzazione del primo evento dedicato agli interventi nella montagna bolognese il 9 febbraio 2023 presso l'Auditorium Centro Enea sul Lago Brasimone nel Comune di Camugnano;
3. Creazione e aggiornamento del sito (<https://www.crescebologna.it/>) e attuale costruzione di un nuovo sito con il Comune di Bologna contenente i progetti a valere sui fondi FSC, React-EU, PNRR, PON Metro;
4. Ideazione della linea editoriale e grafica dedicata alla divulgazione delle relazioni, delle sintesi e dei materiali relativi agli interventi;
5. Realizzazione dello spot istituzionale di “*Cresce Bologna*” sulle aree tematiche del PSC.

3. Informativa sull'introduzione di quote di cofinanziamento di sei interventi con risorse locali e dello Stato

Per gli interventi cui all'elenco è stata introdotta una quota di cofinanziamento per un totale di **6.799.197,51 €** di risorse cofinanziate:

1. *Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola* (SA: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese)
2. *Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel "Lotto H": nuovi alloggi* (SA: Comune di Bologna)
3. *Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna* (SA: Città metropolitana di Bologna)
4. *IIS "Scappi" succursale, ora IPSSAR "Luigi Veronelli", miglioramento sismico - Casalecchio di Reno* (SA: Città metropolitana di Bologna)
5. *IIS "Montessori-Da Vinci", Alto Reno Terme - miglioramento sismico* (SA: Città metropolitana di Bologna)
6. *Convitto Scarabelli, Imola - miglioramento sismico* (SA: Città metropolitana di Bologna)

4. Varie ed eventuali



Art. 3 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza

«La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai membri deliberativi del Comitato, presenti alla seduta cui il verbale si riferisce, entro i successivi 10 giorni lavorativi.

In seguito la Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei membri deliberativi presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Il mancato invio di osservazioni da parte di un membro deliberativo del Comitato vale assenso.

Il verbale si intende approvato decorso tale termine ed inviato a tutti i membri del Comitato.»

Grazie per l'attenzione

Per informazioni fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it
