

Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna

*Delibera CIPESS N. 64/2021
(Gazzetta Ufficiale del 14/01/2022 - Serie generale n. 10)*

Seduta annuale del Comitato di Sorveglianza

17 maggio 2024

Ordine del giorno

1. Relazione sullo stato di attuazione annuale al 31/12/2023 (*per approvazione*)
2. Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa del Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna (*per approvazione*)
3. Introduzione di quote di cofinanziamento di cinque interventi con risorse locali (*informativa*)
4. Varie ed eventuali

Delibera CIPESS n. 2/2021

Punto 4: Istituzione o aggiornamento di un Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il CdS è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- ✓ nella prima seduta di insediamento adotta il proprio regolamento interno su proposta dell'AR del PSC;
- ✓ approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel Piano;
- ✓ **approva le relazioni di attuazione annuale e/o finali;**
- ✓ esamina le proposte di modifica del Piano;
- ✓ esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- ✓ esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- ✓ esamina i risultati delle valutazioni.

1. Approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2023







Piano di Sviluppo e Coesione
Città metropolitana di Bologna
Delibera CIPESS n. 64-2021

PSC
CITTÀ METROPOLITANA
DI BOLOGNA

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023**
(approvata nella seduta del 17/05/2024 del CdS ai sensi
dell'art. 4 lettera II delibera CIPESS 2/2022)



CRESCERE
BOLOGNA
PROGETTI PER LA CITTÀ
METROPOLITANA

Indice

1. IDENTIFICAZIONE PIANO FSC 2014-2020	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4. PSC - QUADRO D'INSIEME (sezione ordinaria)	6
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	13
6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	19
6.1 Procedure di attivazione	13
6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento	13
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO AGGIORNARE	20
8. QUADRO DELLE ECONOMIE	20
9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	20
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	21
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	21
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)	23
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	24
14. VALUTAZIONE	24
15. SORVEGLIANZA	24
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	26
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	27
18. ASSISTENZA TECNICA	28
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	29
20. PROGETTI ESEMPLARI	29
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	30


Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC Sezione ordinaria alla data del 31/12/2023

SETTORI DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	Parte PSC Chiusa	Parte PSC Attiva	Totale PSC
	04 - ENERGIA		
4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
totale	0,00 €	989.192,00 €	989.192,00 €
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
totale	0,00 €	1.990.357,00 €	1.990.357,00 €
	06 - CULTURA		
6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
totale	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	07 - TRASPORTI E MOBILITA'		
7.1 - MOBILITÀ URBANA	0,00 €	40.164.943,45 €	40.164.943,45 €
totale	0,00 €	40.164.943,45 €	40.164.943,45 €
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
totale	0,00 €	29.600.101,00 €	29.600.101,00 €
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
totale	0,00 €	29.675.758,00 €	29.675.758,00 €
	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
12.1 - ASSISTENZA TECNICA	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
totale	0,00 €	1.079.643,00 €	1.079.643,00 €
TOTALE PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA			106.999.994,45 €

* Si precisa che non sussistono variazioni rispetto a quanto presentato nella Relazione annuale sullo stato di attuazione al 31/12/2022, ad eccezione di una lieve variazione della dotazione finanziaria del PSC di un intervento che ha ridotto il suo finanziamento di 5,55 € per ragioni di natura contabile. Dunque, alla data odierna la dotazione finanziaria del PSC è pari a 106.999.994,45€

Tabella 2 - Aree tematiche e settori di intervento.
Ripartizione delle risorse per area tematica.

- 4 ENERGIA
- 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI
- 6 CULTURA
- 7 TRASPORTI E MOBILITA'
- 8 RIQUALIFICAZIONE URBANA
- 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA

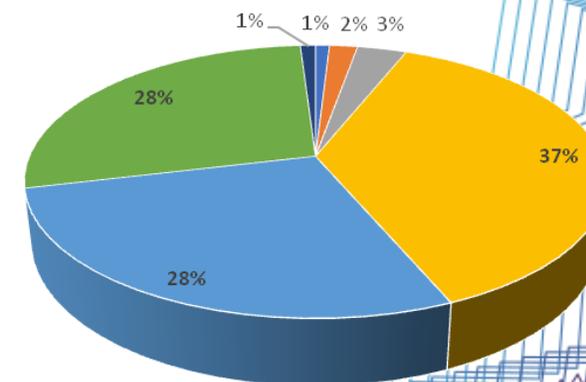

È in fase di perfezionamento tecnico la Delibera CIPESS n.14 del 23/04/2024, "Piani sviluppo coesione (PSC) - Attuazione dell'articolo 44, comma 7 lett. b) e comma 7 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22"

Avanzamento contabile per area tematica al 31/12/2023

Area tematica	N. interventi strategici	Risorse totali (risorse FSC+cofinanziamenti) (A)	Costo ammesso FSC al netto delle economie (B)	Economie registrate da riprogrammare (C)	Costo realizzato FSC (D)	Impegni ammessi FSC (E)	Pagamenti ammessi FSC (F)	Avanzamento della spesa (F/B)
4. Energia	1	€ 989.192,00	€ 989.192,00		€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	98%
5. Ambiente e Risorse naturali	9	€ 2.393.846,72	€ 1.981.212,66	€ 9.144,34	€ 1.972.923,42	€ 1.981.212,66	€ 1.972.923,42	99%
6. Cultura	3	€ 4.930.239,10	€ 3.499.390,34	€ 609,66	€ 2.135.124,69	€ 3.499.390,34	€ 2.135.124,69	61%
7. Trasporti e mobilità	4	€ 45.333.396,42	€ 40.164.943,45		€ 19.239.471,02	€ 37.292.789,27	€ 19.001.355,80	47%
8. Riqualificazione urbana	2	€ 34.600.101,00	€ 29.600.101,00		€ 10.515.091,87	€ 26.327.172,41	€ 10.515.091,87	36%
11. Istruzione e formazione	10	€ 33.581.414,08	€ 29.675.758,00		€ 12.091.475,99	€ 26.660.552,23	€ 12.091.475,99	41%
12. Capacità amministrativa	1	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00		€ 776.359,80	€ 1.016.942,27	€ 776.359,80	72%
TOTALE	30	€ 122.907.832,32	€ 106.990.240,45	€ 9.754,00	€ 47.699.788,04	€ 97.766.918,97	€ 47.461.672,82	44%

Avanzamento procedurale per area tematica al 31/12/2023

Area tematica	N. interventi strategici	Lavori aggiudicati	Esecuzione lavori	Lavori conclusi
05 - Ambiente e risorse naturali	9			9
06 - Cultura	3		1	2
07- Trasporti e Mobilità	3		3	
08 - Riqualificazione urbana	2		2	
04 - Energia	1			1
11- Istruzione e Formazione	10	1	4	5
TOTALE	28*	1	10	17

*Si riportano i dati di sintesi procedurale dei 28 interventi di opere pubbliche del programma, suddivisi per aree tematiche.

I restanti 2 interventi sono relativi a fornitura di beni e servizi. In particolare si evidenzia che:

- la **Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore** risulta conclusa con l'approvazione del "progetto definitivo";
- l'**Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione** è in corso di attuazione e proseguirà fino alla conclusione dell'attuazione dell'intero PSC.

Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento al 31/12/2023

La tabella (pag. 15 della Relazione) illustra le seguenti voci di informazioni per tipologia di intervento:

- ✓ **nome dell'intervento strategico;**
- ✓ **codice progetto**, inserito in BDU;
- ✓ **settore d'intervento**, a cui l'intervento appartiene;
- ✓ **soggetto attuatore** (CM, Comuni, Unioni dei Comuni);
- ✓ **risorse totali** (risorse FSC+ cofinanziamento) dell'intervento;
- ✓ **costo ammesso al netto delle economie** (deriva dalla differenza tra il finanziamento FSC e l'ammontare delle economie FSC che possono generarsi alla chiusura del progetto. Qualora non vi siano economie, esso corrisponde con il finanziamento FSC);
- ✓ **economie registrate da riprogrammare;**
- ✓ **costo realizzato con risorse FSC al 31.12.23** (coincide con la somma degli importi liquidati, la differenza tra costo realizzato e pagamenti è dovuta all'asincronia temporale tra gli atti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento non ancora emessi);
- ✓ **impegni ammessi FSC al 31.12.23;**
- ✓ **pagamenti ammessi FSC al 31.12.23;**
- ✓ **avanzamento procedurale** (gara aggiudicata e lavori consegnati/ esecuzione lavori/ lavori conclusi).




Presidenza
del Consiglio dei Ministri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Intervento strategico	Codice	Settore di intervento	Soggetto attuatore	Risorse totali (risorse FSC+ Cofinanziamento)	Costo ammesso al netto dell'economie ²	Economie registrate da riprogrammare	Costo realizzato FSC ⁴	Impegni ammessi FSC	Pagamenti ammessi FSC	Avanzamento procedurale
Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	BOSM01	4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	Città metropolitana di Bologna	€ 989.192,00	€ 989.192,00		€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	Lavori conclusi
				€ 989.192,00	€ 989.192,00		€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	
Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano	BOAB03	5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 140.000,00	€ 131.702,24	€ 8.297,76	€ 131.702,24	€ 131.702,24	€ 131.702,24	Lavori conclusi
08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Mutavacca - Comune di Gaggio Montano	BOAB01		Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 150.000,00	€ 149.440,12		€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	Lavori conclusi
08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Alano (BO) (stralcio funzionale)	BOAB02		Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 120.000,00	€ 110.916,88		€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	Lavori conclusi
Opere di consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini	BOAB04		Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 340.059,60	€ 339.153,42	€ 846,58	€ 339.153,42	€ 339.153,42	€ 339.153,42	Lavori conclusi
Interventi di consolidamento dei versanti in località Ca Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	BOSI01		Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 300.842,58	€ 191.940,75		€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	Lavori conclusi
Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) - 1° Stralcio	BOSI02		Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 494.093,46	€ 313.352,90		€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	Lavori conclusi
Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	BOSI03		Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 244.706,32	€ 244.706,32		€ 244.706,32	€ 244.706,32	€ 244.706,32	Lavori conclusi
Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	BOVS01		Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 500.000,00	€ 395.855,24		€ 395.057,07	€ 395.855,24	€ 395.057,07	Lavori conclusi
Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro	BOSV02		Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 104.144,76	€ 104.144,76		€ 96.653,69	€ 104.144,76	€ 96.653,69	Lavori conclusi
					€ 2.393.846,72	€ 1.981.212,66	€ 9.144,34	€ 1.972.923,42	€ 1.981.212,66	€ 1.972.923,42
Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	BOVE01	6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	Comune di Vergato	€ 500.000,00	€ 399.760,90		€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	Lavori conclusi
Realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato - Lavori di sistemazione dell'area esterna	BOVE02		Comune di Vergato	€ 100.239,10	€ 99.629,44	€ 609,66	€ 99.629,44	€ 99.629,44	€ 99.629,44	Lavori conclusi
Riqualificazione dell'area Teatro Comunale	BOTC01		Comune di Bologna	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00		€ 1.635.734,35	€ 3.000.000,00	€ 1.635.734,35	Esecuzione lavori
				€ 4.930.239,10	€ 3.499.390,34	€ 609,66	€ 2.135.124,69	€ 3.499.390,34	€ 2.135.124,69	
Nodo di Rastignano - 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano - Ponte delle Ocche	BORA01	7.1 - MOBILITÀ URBANA	Città metropolitana di Bologna	€ 31.164.943,45	€ 30.664.943,45		€ 12.601.672,31	€ 28.001.654,51	€ 12.601.672,31	Esecuzione lavori
Progettazione linea tram FICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore	BOTR01		Comune di Bologna	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00		€ 3.992.453,48	€ 4.000.000,00	€ 3.992.453,48	Servizio di progettazione conclusa
Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	BOIM01		Comune di Imola	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		€ 1.536.143,19	€ 3.000.000,00	€ 1.536.143,19	Esecuzione lavori
Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovía del Sole Marzabotto-Silla-stralcio funzionale Sperticano-Riola	BOEU01		Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 3.230.000,00	€ 2.500.000,00		€ 1.109.202,04	€ 2.291.134,76	€ 871.086,82	Esecuzione lavori
				€ 45.333.396,42	€ 40.164.943,45		€ 19.239.471,02	€ 37.292.789,27	€ 19.001.355,80	

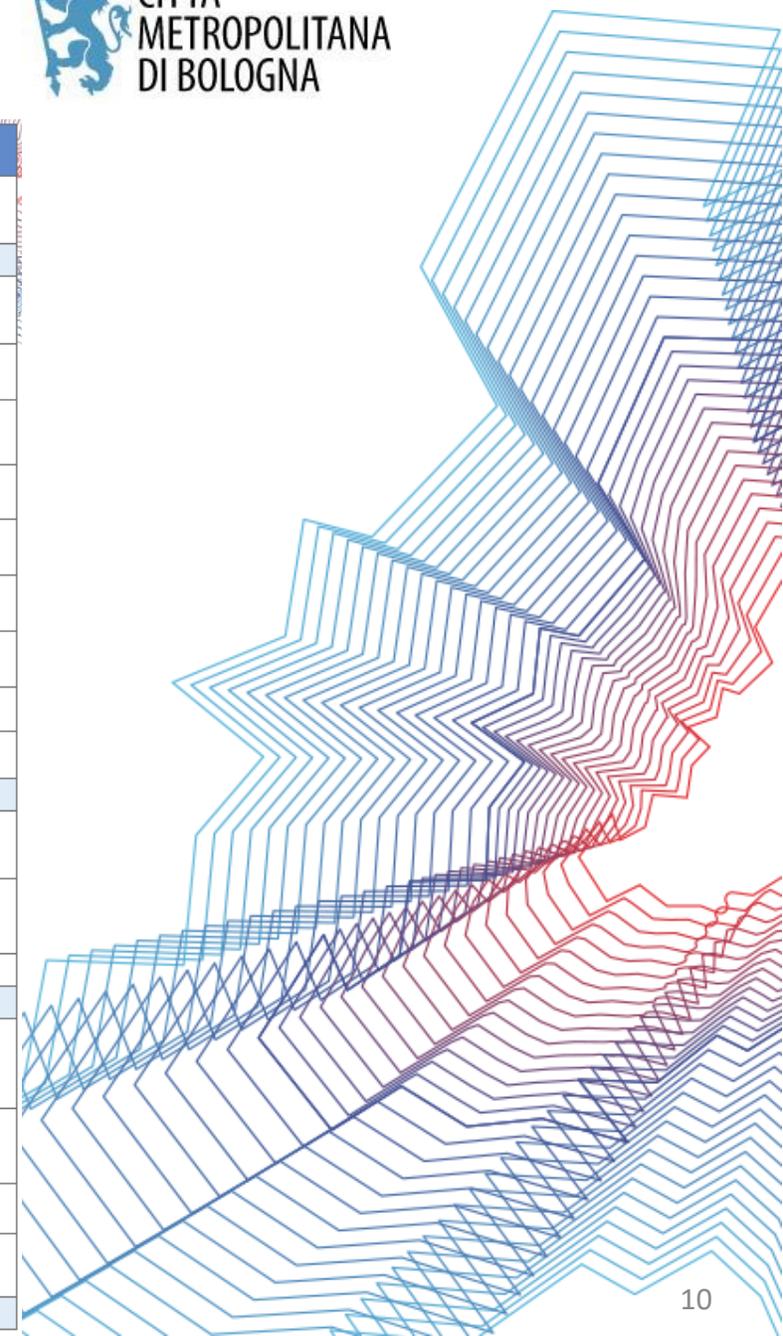

2. Prospetto 4 – Aggiornamento del Piano finanziario relativamente alle previsioni triennali di spesa

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (2023) (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2024) (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2025) (3)	Dotazione del PSC (1+2+3)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	47.699.788,04 €	43.197.602,65 €	16.102.603,76 €	106.999.994,45 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
totale	47.699.788,04 €	43.197.602,65 €	16.102.603,76 €	106.999.994,45 €

L'implementazione del PSC: informazione e pubblicità

1. **Attività divulgativa:** il 9 febbraio 2023 è stata realizzato un evento dedicato agli interventi nella **montagna bolognese**, dal titolo “**SISTEMA APPENNINO. Una nuova stagione di investimenti e opportunità**”, presso l’Auditorium Centro Enea sul Lago Brasimone nel Comune di Camugnano e rivolto agli stakeholder pubblici e privati del territorio montano (tutti i materiali, video e foto sono disponibili a questi link:

<https://www.crescebologna.it/programmi/fsc/documentazione/attivita-divulgative>, https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Sistema_Appennino_una_nuova_stagione_di_investimenti_e_opportunita_1, https://youtu.be/P0j_2Hz_KVU).

2. **Nuovo sito:** a settembre 2023 è andato on line il nuovo sito di “**Cresce Bologna**” (<https://www.crescebologna.it/>), condiviso con il Comune di Bologna e dedicato ai progetti strategici che ricadono nel territorio metropolitano e nel capoluogo; oltre a raccogliere tutta la documentazione inerente all’attuazione del PSC finanziato dal FSC 2014-2020 contiene anche i progetti del PON Metro e del PNRR.

3. **Altri strumenti di divulgazione:**

- è stato ideato e realizzato il progetto grafico di varie tipologie di cartelli di allestimento del cantiere dell’intervento “**Nodo di Rastignano 2° lotto**” da posizionare in luoghi strategici per la comunicazione concordati coi Comuni coinvolti al fine di promuovere la diffusione delle informazioni legate all’impatto dell’intervento presso le comunità locali.
- sono stati realizzati due totem che raccontano l’intervento “**Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico**” all’interno del più ampio contesto di sostenibilità legato al complesso Villa Smeraldi, al fine di dare visibilità ai temi dell’efficientamento energetico per i visitatori del Museo.



Progetti esemplari

Obiettivi e indicatori di realizzazione e di risultato per area tematica

Area tematica	PSC sezione ordinaria	Settore d'intervento	Obiettivi	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
4 - ENERGIA	989.192,00 €	4.1 EFFICIENZA ENERGETICA	Promozione della tradizione bolognese attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico per la conservazione delle ricchezze del territorio	1) Riduzione dei consumi di energia elettrica 2) Miglioramento della classe energetica certificata	1) Superficie oggetto di intervento (MQ) → 5.300 mq realizzati
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.990.357,00 €	5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	Favorire il ripopolamento del territorio dell'appennino bolognese attraverso opere di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico	1) Riduzione della popolazione esposta a rischio frane	1) Superficie oggetto di intervento (MQ) → 1.086.922 mq realizzati

- A. Intervento di consolidamento pendici in località Calderino
- B. Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro
- C. Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano
- D. Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano
- E. Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano
- F. Opere di completamento del consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torrente Savena, Rio Ordini
- G. Intervento di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro
- H. Intervento di consolidamento dei versanti in località Bruscoli - 1° Stralcio nel Comune di Monghidoro
- I. Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro
- J. Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico

Interventi contro il dissesto idrogeologico

Una parte delle risorse FSC della Città metropolitana di Bologna sono state utilizzate per interventi di carattere ambientale, ed in particolare, volti alla prevenzione e/o risoluzione di fenomeni di dissesto idrogeologico nelle zone dell'Appennino metropolitano

9 interventi: 4 nell'Unione Appennino Bolognese, 3 nell'Unione Savena Idice e 2 nell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia;
€ 1.990.357 investimento risorse FSC



Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca (Castel d'Aiano)



Opere di completamento del consolidamento dei versanti, Torrente Savena, Rio Ordini nella località Castel dell'Alpi (San Benedetto Val di Sambro)



Opere di consolidamento dei versanti a Camugnano




Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca (Gaggio Montano)



Interventi di consolidamento dei versanti in località Ca Nova Michela (Monghidoro)



Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli (Monghidoro)




Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola (Monghidoro)



Intervento di consolidamento pendici in località Calderino (Monte San Pietro)



Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi (Monte San Pietro)

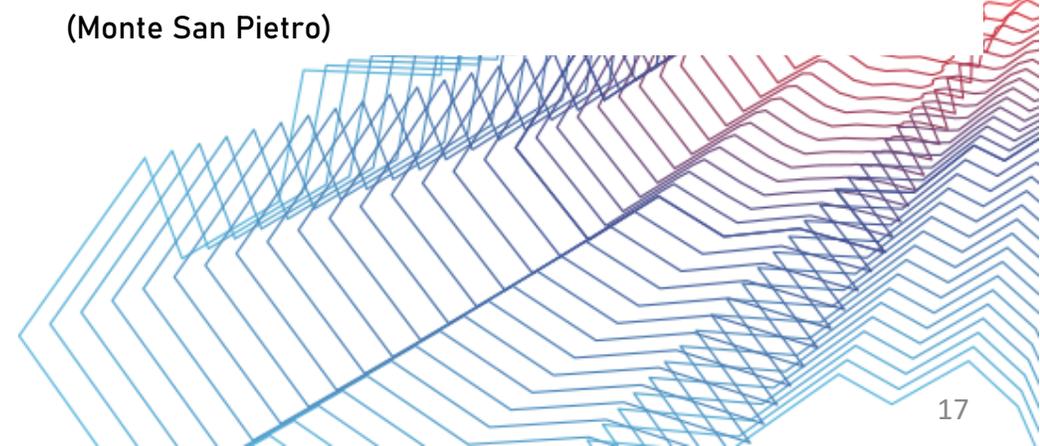

Riqualficazione ed efficientamento energetico del museo di Villa Smeraldi

€ 989.192

Lavori conclusi il 14/12/2020
collaudo del 19/05/2021



Gli interventi realizzati hanno riguardato:


- installazione di nuovi impianti in pompa di calore,
- sostituzione delle caldaie a gas presenti e a servizio di una parte del complesso con caldaie più moderne e performanti;
- installazione di un impianto fotovoltaico a copertura di parte dei consumi energetici,
- realizzazione di opere di canalizzazione in cui collocare le reti tecnologiche di supporto alle nuove strutture, prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a loro futuri ampliamenti;
- sostituzione dei corpi illuminanti ad incandescenza, con corpi di moderna concezione, al led, consentendo un abbattimento del consumo di energia per illuminazione pari ad almeno il 50%;
- installazione su alcune delle aree maggiormente utilizzabili di igienizzatori di ambiente che, mediante idonee soluzioni alcoliche emesse a mezzo di aerosol in orari prestabiliti, rendono maggiormente salubre e igienico l'ambiente utilizzato.

3. Informativa sull'introduzione di quote di cofinanziamento di cinque interventi con risorse locali

Per gli interventi cui all'elenco è stata introdotta una quota di cofinanziamento per un totale di **362.501,37 €** di risorse cofinanziate:

1. **Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A** (SA: Comune di Imola)
2. **Nodo di Rastignano - 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano - Ponte delle Oche** (SA: Città metropolitana di Bologna)
3. **Costruzione Nuovo Polo Dinamico** (SA: Città metropolitana di Bologna)
4. **Convitto Scarabelli, Imola - miglioramento sismico** (SA: Città metropolitana di Bologna)
5. **Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani** (SA: Città metropolitana di Bologna)

4. Varie ed eventuali

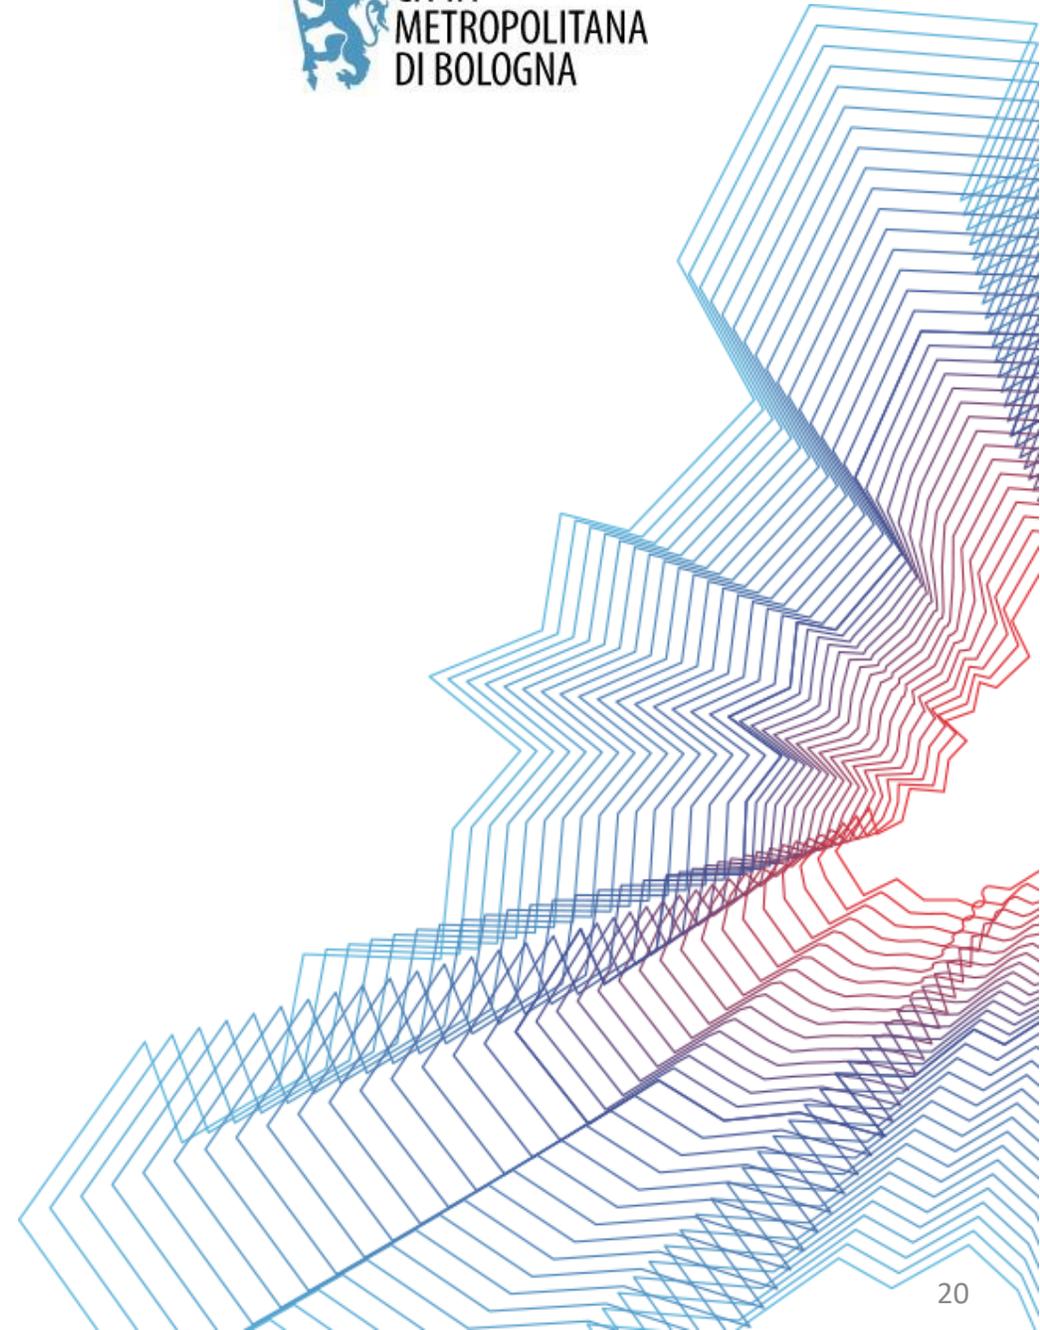

Art. 3 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza

«La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai membri deliberativi del Comitato, presenti alla seduta cui il verbale si riferisce, entro i successivi 10 giorni lavorativi.

In seguito la Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei membri deliberativi presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 7 giorni lavorativi.

Il mancato invio di osservazioni da parte di un membro deliberativo del Comitato vale assenso.

Il verbale si intende approvato decorso tale termine ed inviato a tutti i membri del Comitato.»

Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito CresceBologna al seguente link <https://www.crescebologna.it/index.php/programmi/fsc/documentazione/comitato-di-sorveglianza>

Grazie per l'attenzione

Per informazioni fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it
